

## روش اجرایی نحوه تنظیم موافقتنامه اقلام خارج از قرارداد

### هدف :

کنترل و تنظیم صحیح اقلام توافقی خارج از قرارداد در طرحهای عمرانی

### فرآیند اصلی :

تحویل انرژی الکتریکی

### زیر فرآیند اصلی :

اجرا و نظارت بر احداث شبکه توزیع

### دامنه عملکرد :

دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه - مدیریت برق شهرستان - اداره بازرگانی  
ذیحساب طرحهای عمرانی - اداره مهندسی و برنامه ریزی

### ذینفعان :

انتظارات/ترمیمات	ذینفع	ردیف
رعایت شرایط عمومی پیمان و دستورالعمل های وابسته	استاندارداری خراسان رضوی	۱
بررسی و تأیید به موقع کالا و خدمات	تامین کنندگان کالا و خدمات	۲

## تعاریف :

-

## مراجع :

-

## ضمائم :

(31F36)

(31I01)

(12F43)

- فرم تعیین قیمت اقلام خارج از قرارداد

- لیست اقلام خارج از قرارداد


- فرم بازرنگری طرح/پروژه

## مدارک وابسته:

-

## شرح :

با توجه به بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که موضوع تغییر مقادیر کار می باشد، اگر در چهارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد، پیمانکار باید بلافاصله پس از دریافت ابلاغ کارهای جدید از مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده به همراه تجزیه قیمت به مهندس مشاور ارائه نماید. قیمت مصوب کالا، توسط اداره بازرگانی شرکت و قیمت مصوب عملیات توسط دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه مشخص می گردد و ملاک پرداخت است. پس از تعیین قیمت‌های مصوب و اعمال ضریب بالاسری، لازم است مشاور کنترل نماید سر جمع اقلام توافقی از ۱۰٪ مبلغ کل پیمان بیشتر نگردد. در غیر این صورت لازم است با هماهنگی مدیریت برق شهرستان نسبت به اصلاح حجم کار تا سقف ۱۰٪ پیمان اقدام و سپس جهت اجرا به پیمانکار ابلاغ نماید. قیمت های مصوب باید بر اساس هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد، لذا تنها ضریب بالاسری پیمان به قیمت‌های مصوب جدید اعمال می گردد.

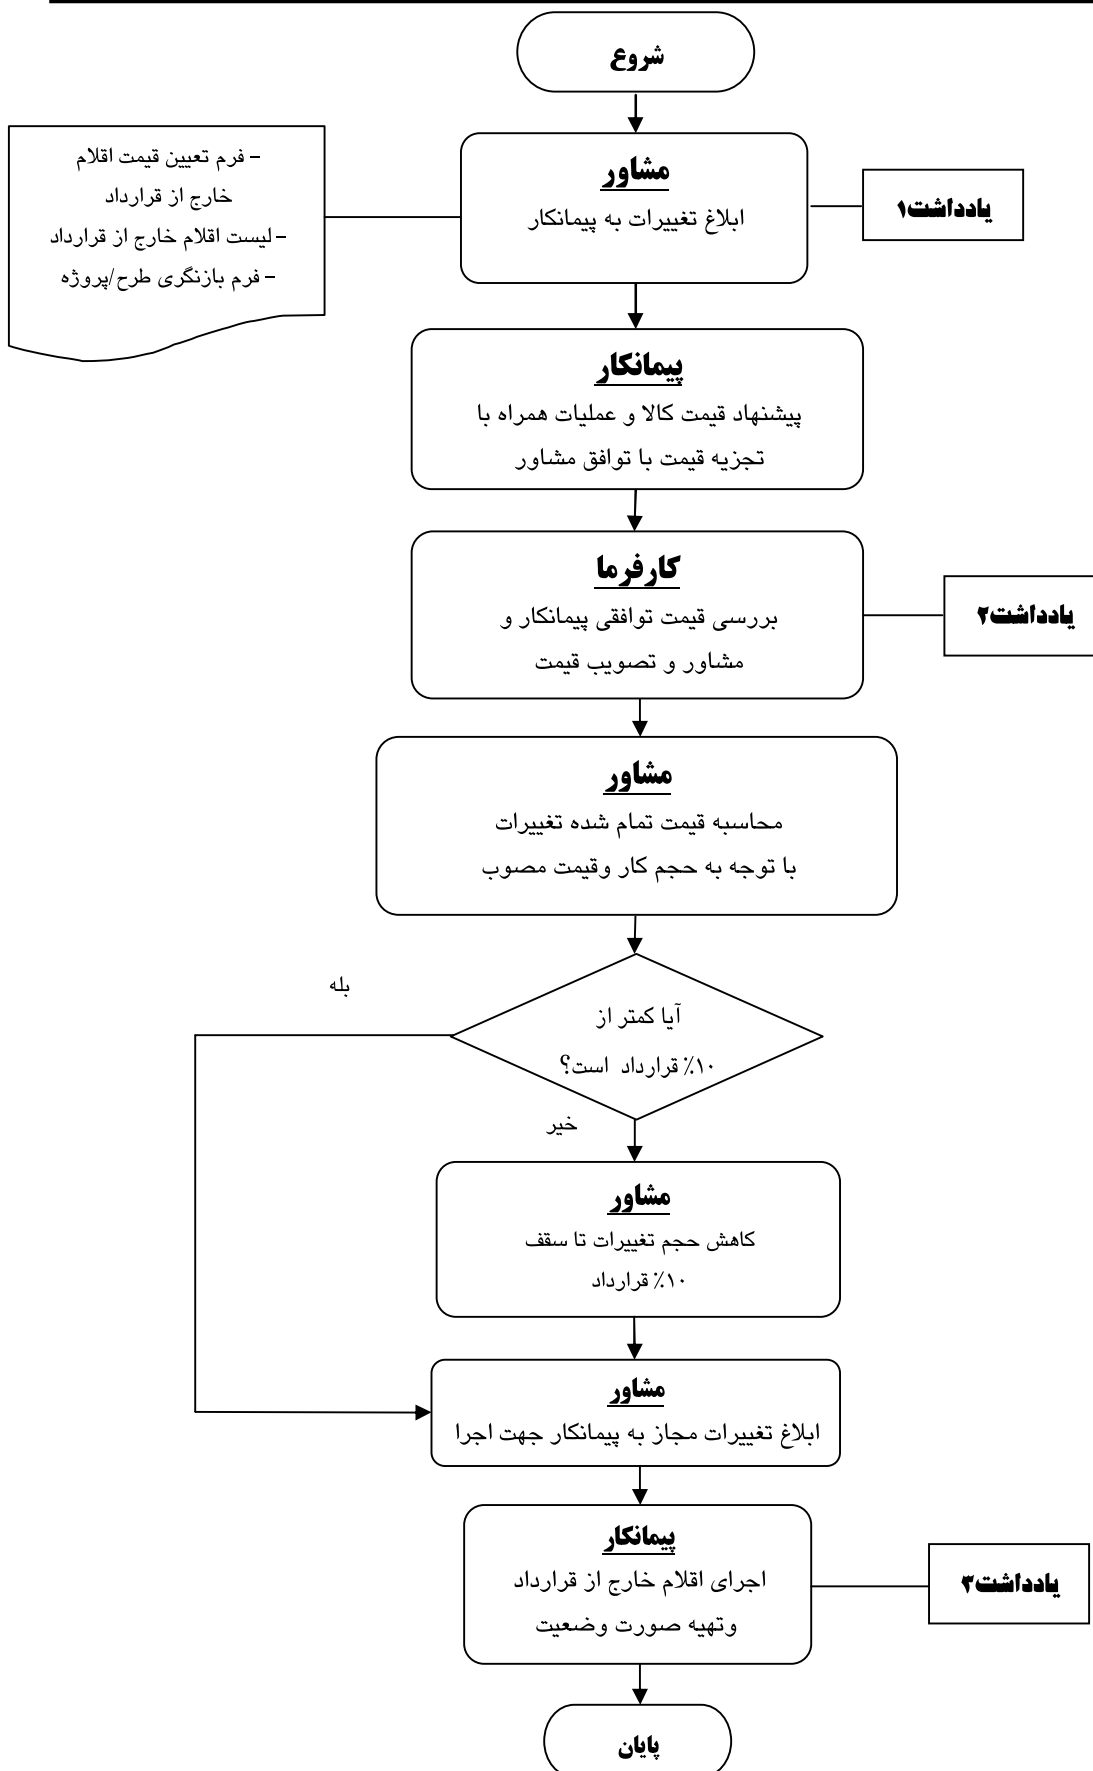

### یادداشت ۱ :

تغییرات باید مورد تأیید مدیریت برق شهرستان باشد و میزان و نوع آن طی نامه به مشاور ابلاغ شده باشد. ضمناً در نامه ابلاغ به پیمانکار نوع و میزان تغییرات درج می گردد.

### یادداشت ۲ :

قیمت واحد کالا توسط اداره بازرگانی و قیمت واحد عملیات توسط دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه تصویب می گردد.

### یادداشت ۳ :

پیمانکار باید کلیه ضوابط مربوط به اجرای پروژه در بخش اقلام توافقی را مطابق قسمت اصلی پروژه و قرارداد رعایت نماید. (اخذ تأییدیه کمیسیون فنی و ...)
